



INICIAÇÃO

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Objetivo

Auxiliar na definição do escopo do projeto por meio de representação gráfica contendo a subdivisão das principais entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis.

Tempo

Preparação: 5 minutos, para salvar o documento modelo.

Execução: 1 hora.

Equipe

O ideal é que estejam presentes todos os envolvidos no projeto.

Materiais/Recursos

O ideal é que estejam presentes todos os envolvidos no projeto.



Ponto de atenção!


A EAP não deve ser elaborada pensando nas características do produto do projeto, mas no trabalho a ser feito para a sua realização. Além de constituir um importante instrumento de comunicação entre todos os envolvidos no projeto, permite também visualizar todo o escopo do trabalho a ser realizado no projeto.

Passo a passo

No nível 1, descreva o nome do projeto ou programa, utilize substantivos;

No nível 2, descreva as fases do ciclo de vida do projeto, ou principais entregas, utilize substantivos;

No nível 3, descreva os pacotes de trabalho, utilize verbos no infinitivo.

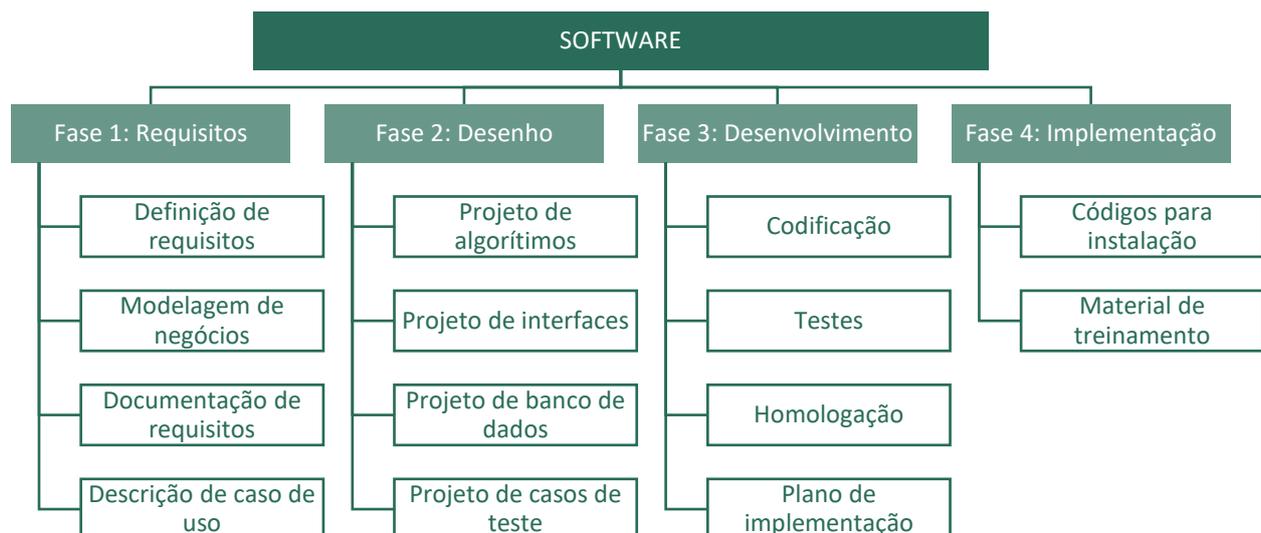

Modelos Editáveis

[EAP dos Projetos Taxigov e Registro Textual de Sessões de Julgamento](#)

